



Project Progress Review (PPR) 5-2026





CPER

- Programmation en cours
 - Attente du retour de la programmation (16/01/25)
 - Retour programmation 7/03/25
 - Programme = 3,2M€ => Hors budget
 - Objectif est de trouver une solution intégrant radioprotection et l'environnement de PERLE : CTA, Groupe froid, modifications électriques dans l'enveloppe de 2 M€
 - Finalisation de la solution de l'équipe projet
 - Présentation aux programmistes le 20 juin
 - Discussion avec le responsable infrastructure de la programmation le 26 juin
 - Visite des galeries avec le responsable fluide de la programmation le 30 juin
 - Retours faisabilité et chiffrage prévu le 04 juillet et repoussé au 11 juillet
 - Coût opération : 2,5 M€TDC
 - Dossier d'expertise finalisé le 10 septembre 2025, présenté en pré-CA UPSAY fin septembre. DEX présenté en CA UPSAY début octobre et IDF ensuite.
 - Programme rendu par la société : doit être entièrement repris



CPER

- **Programme publié :** [Atrium WP13 / InfrastructureWP13-1/ CPER programme technique détaillé.pdf](#)
- 9 juin : MOE sélection par la DAPI, groupement (Architecte, BET, paysagiste, BET environnement)
- Notification prévu fin juin et réunion de lancement le 2 juillet + visite igloo en fin de journée.
- Juillet-août le MOE travaille sur le programme : Jalon fin juillet
- Septembre : début de la collaboration MOE/IJCLab

...

Pour information :

RTESR (Référentiel Technique de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche) : l'Igloo et ses annexes sont numérotés 201 et non 209C



Etat d'avancement : planning général


	Date ou période
Etudes de programmation	Décembre 2025
Lancement de la procédure MOE	Janvier 2026
Notification MOE	Mars 2026
Etudes de conception MOE (DIAG, AVP, PRO, DCE)	7 mois
Publication Appel d'offres Travaux	Octobre 2026
Analyse + négociation	3 mois
Notification Marchés Entreprises	Janvier 2027
Durée des travaux, y compris préparation de chantier	7 mois
Réception et Mise en service	Septembre 2027

Décalage de 4 mois

Notification MOE	Juillet 2026
Notification marchés entreprises	Mai 2027
Réception et mise en service	Janvier 2028




planning projet

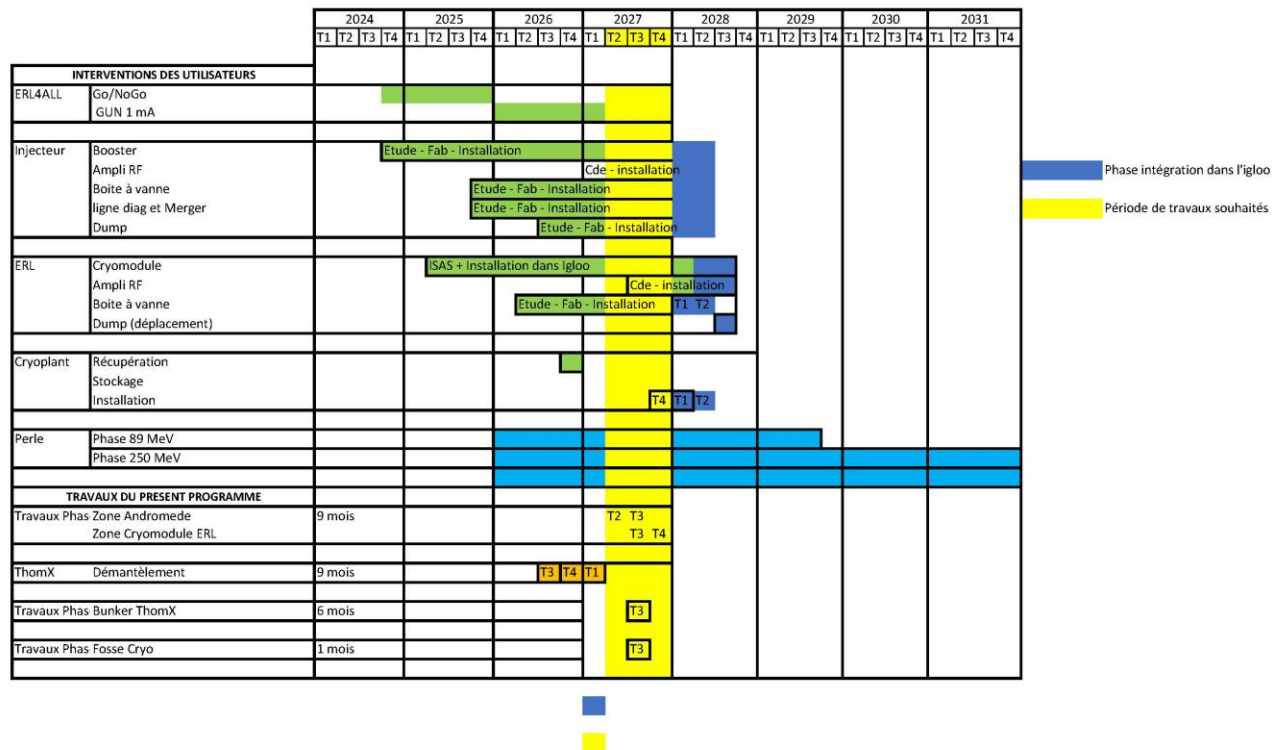



Principe d'implantation : percements et murs

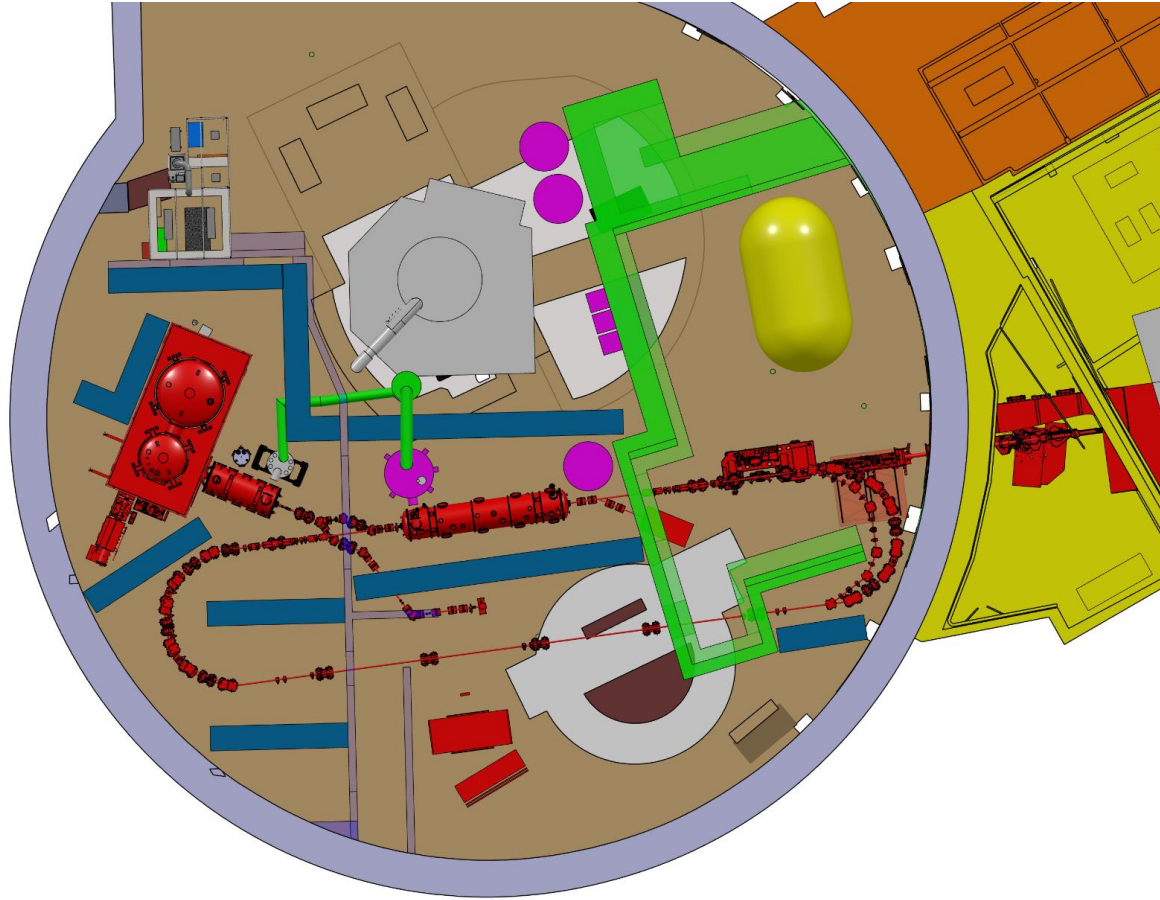

Pas ou peu de destruction
Percements dans les 2 bunkers existants
Ajout de murs de 1 m d'épaisseur constitués
de « légo » béton (bleu sur l'image)

2 x 50cm en quinconce





Principe d'implantation : couverture

